Einen Netzplan erstellen

1. Aufgaben

Ein Projekt beginnt mit dem Vorgang A. Nachdem dieser Vorgang nac abgeschlossen ist, folgen drei parallele Vorgänge: B hat 6 Tage, D dauert 8 Tage, Dauer. B hat den Nachfolger C mit 4 Tagen, an den sich der Vorgang F r anschließt. C und D haben zusammen mit E den gemeinsamen Nachfolger F mit F folgt noch der Vorgang G mit 2 Tagen. Danach ist das Projekt beendet.

Aufgaben:

1. a) Erstellen Sie die Vorgangsliste.
2. b) Erstellen sie ein Balkendiagramm (Gantt-Diagramm) und zeichnen Sie Abhängigkeiten ein.
3. c) Zeichnen Sie den Netzplan (Vorgangsknotennetz).
4. d) Führen Sie die Vor- und Rückwärtsrechnung durch.
5. e) Ermitteln Sie die Zeitreserven (Puffer) und den kritischen Weg.

Bitte verwenden Sie für die Knoten die folgende Darstellung:

Legende:

FAZ	Dauer	FEZ
Vorgang	Beschreibung	
SAZ	GP	SEZ

FAZ: Frühester Anfangszeitpunktg
FEZ: Frühester Endzeitpunkt
SAZ: Spätester Anfangszeitpunkt
GP: Gesamtpuffer
SEZ: Spätester Endzeitpunkt

Lösung

zu a) Vorgangsliste

Vorgang	Vorgänger	Nachfolger	Dauer
A	-	B, D, E	3
B	A	C	6
C	B	F	4
D	A	F	8
E	A	F	5
F	C, D, E	G	3
G	F	-	2

zu b) Balkendiagramm

dargestellt als Gantt-Diagramm in MS-Project

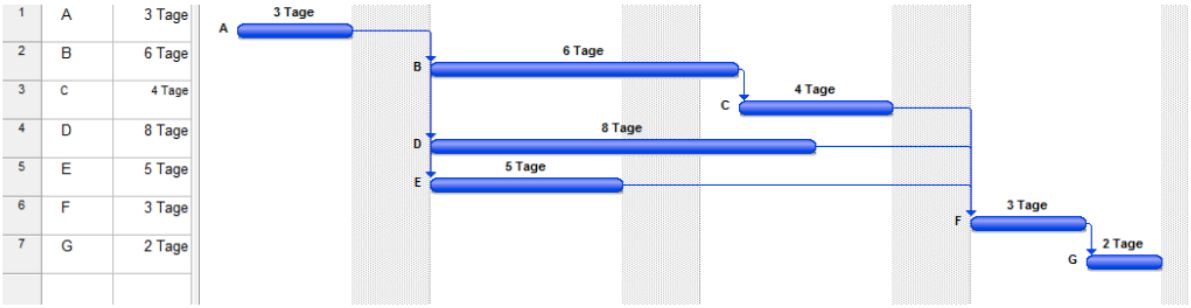

Geplante Gesamtdauer (in Arbeitstagen): 18 Tage

zu c), d) und e) Netzplan
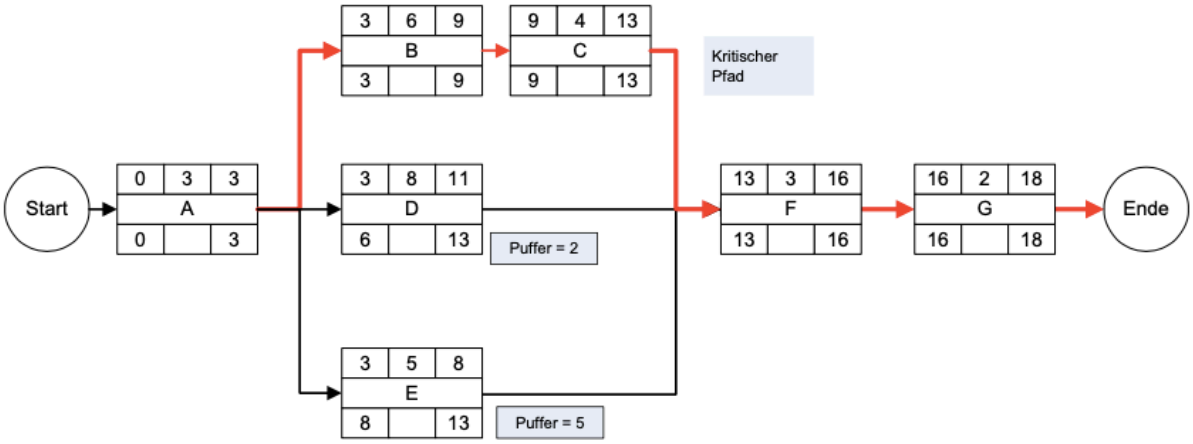
Netzplan als Visio-Diagramm
