IHK GH1 18

<u>Handlungsschritt 1</u>

Die eCo GmbH plant das Teilprojekt „LAN" für die Pharmalog GmbH.

a) Das Teilprojekt „LAN" wurde wie folgt geplant.

Erstellen Sie anhand der Vorgangsliste einen Netzplan (Seite 2) und kennzeichnen Sie den kritischen Pfad. (16 Punkte)

Vorgang	Beschreibung	Dauer	Vorgänger
A	Planung	4	-
B	Beschaffung Hardware	5	A
C	Beschaffung Standard-Software	2	A
D	Erstellung Individual-Software	10	A
E	Installation Netzwerkkomponenten	7	B
F	Installation Software und Computer	4	C, D
G	Tests und Übergabe	7	E, F

b) Die Pharmalog GmbH legt besonders großen Wert auf die Qualität der von ihr entwickelten Software.

ba) Die Software soll folgende Qualitätsmerkmale besitzen.

- Portability - Maintainability - Efficency - Reliability - Functionality - Usability

Erläutern Sie **<u>drei</u>** dieser Qualitätsmerkmale. (6 Punkte)

bb) Nennen Sie drei Maßnahmen zur Qualitätssicherung. (3 Punkte)

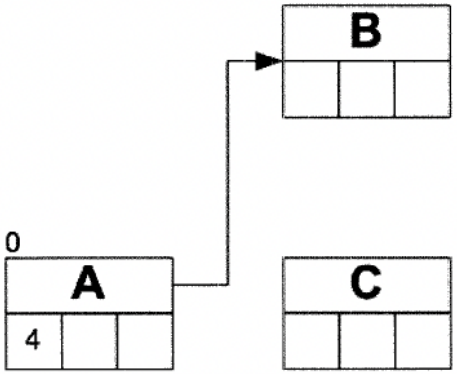

Vorgangsliste

Vorgang	Beschreibung	Dauer	Vorgänger
A	Planung	4	-
B	Beschaffung Hardware	5	A
C	Beschaffung Standard-Software	2	A
D	Erstellung Individual-Software	10	A
E	Installation Netzwerkkomponenten	7	B
F	Installation Software und Computer	4	C, D
G	Tests und Übergabe	7	E, F



Vorgang	Vorgangs-ID (A, B, C ...)
Dauer	Dauer in Arbeitstagen
FAZ	Frühester Anfangszeitpunkt
FEZ	Frühester Endzeitpunkt
SAZ	Spätester Anfangszeitpunkt
SEZ	Spätester Endzeitpunkt
GP	Gesamtpuffer, GP = SAZ – FAZ oder GP = SEZ – FEZ
FP	Freier Puffer, FP = FAZ des Nachfolgers – FEZ des Vorgangs
